

**NOTARIA PUBLICA SEGUNDA
DEL CANTÓN SUCRE**

Telf: 2693-342

TESTIMONIO

De: PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS
DE HORMIGON SIMPLE Y ADOQUINAMIENTO EN EL SITIO SAN AGUSTIN KM. 20

PARROQUIA LEONIDAS PLAZA

Otorgada por: _____

a favor de: _____

por la cuantía de \$ INDETERMINADA

y Autorizado por el Notario

AB. PEDRO DAVILA TALLEDO

Copia: CUARTA

Registro: UNICO NUMERO

762


Bahía de Caráquez, ABRIL, 13

de 2.010

COPIA

ESCRITURA NÚMERO: 762

PROTOCOLIZACIÓN: DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS DE HORMIGON SIMPLE Y ADOQUINAMIENTO EN EL SITIO SAN AGUSTIN - KM 20 - DE LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA, CANTON SUCRE.- POR LA SUMA DE: I N D E T E R M I N A D A.-



En la Ciudad de Bahía de Caráquez, Cabecera del Cantón Sucre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día martes trece (13) de abril de dos mil diez (2010), ante MÍ, ABOGADO PEDRO DAVILA TALLEDO, NOTARIO PUBLICO SEGUNDO DEL CANTÓN SUCRE.- A petición de parte interesada del Abogado Eugenio Ureta Chica, con Registro Profesional Número Nueve Mil Setenta y Tres (9.073) del Colegio de Abogados de Manabí (C.A.M.) y de conformidad con el Artículo dieciocho (18) numeral Dos (2) de la Ley Notarial en vigencia procedo a protocolizar como en efecto protocolizo el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS DE HORMIGON SIMPLE Y ADOQUINAMIENTO EN EL SITIO SAN AGUSTIN - KM 20 - DE LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA, CANTON SUCRE.- Datos tomados del documento que en Doscientos Sesenta y Una (261) fojas útiles, entran a formar parte de los archivos a mi cargo, las cuales firmo y sello para mayor constancia en fe de lo actuado. EL NOTARIO DOY FE.-

[Handwritten signature]

13 ABR 2010
Abg. Pedro Dávila Talledo
Notario Público 2do. del Cantón Sucre

ABOGADO PEDRO DAVILA TALLEDO
NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO DEL CANTÓN SUCRE



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO
CONFIERO ESTA C U A R T A COPIA
CERTIFICADA LA MISMA QUE FIRMO Y SELLO EN
BAHÍA DE CARÁQUEZ, EN LA FECHA DE SU
CELEBRACIÓN.- EL NOTARIO DOY FE.-

ABOGADO PEDRO DAVILA TALLEDO
NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO DEL CANTÓN SUCRE





GOBIERNO CANTONAL DE SUCRE
BAHÍA DE CARAQUEZ CIUDAD ECOLOGICA
DIRECCION ASESORIA JURIDICA

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS DE HORMIGON SIMPLE Y ADOQUINAMIENTO EN EL SITIO SAN AGUSTIN KM. 20 DE LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA, CANTON SUCRE.-

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Cantonal de Sucre, debidamente representado por los señores Dr. Carlos Mendoza Rodriguez y Abg. Eugenio Ureta Chica en sus calidades de Alcalde del Gobierno Cantonal de Sucre y Procurador Sindico Municipal, tal y como se justifica con la certificación conferida por la señora Secretaria General del Gobierno Cantonal de Sucre que se adjunta como documento habilitante; a quien en adelante se le denominará "LA CONTRATANTE"; y, por otra, el señor Ing. Graciela Jacqueline Mendoza Solórzano, portador de la Cédula de Ciudadanía N° 130430021-1, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA". Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP–, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de la obra "**Construcción de Aceras y Bordillos de hormigón Simple y Adoquinamiento en el sitio San Agustín Km. 20 de la parroquia Leonidas Plaza, Cantón Sucre**"

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar los pliegos del procedimiento de Menor Cuantía signado MCO- GCS –No. 010 – 2010 para la contratación de la obra "**Construcción de Aceras y Bordillos de hormigón Simple y Adoquinamiento en el sitio San Agustín Km. 20 de la parroquia Leonidas Plaza, Cantón Sucre**"

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. B.300.360.750104.000.1 conforme consta en la certificación conferida por el señor Econ. Winston Muñoz Zambrano, Director Financiero del Gobierno Cantonal de Sucre, mediante oficio No. 067-DFGCS de fecha 18 de Marzo del 2010.

1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el día 22 de marzo del 2010, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.


FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
LO CERTIFICO

la Cantón

13 ABR 2010

Pedro Dávila Talledo

Abogado 2do. del Cantón Sucre



1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución de fecha 06 de Abril del 2010, adjudicó la "Construcción de Aceras y Bordillos de hormigón Simple y Adoquinamiento en el sitio San Agustín Km. 20 de la parroquia Leonidas Plaza, Cantón Sucre" a la oferente Ing. Graciela Jacqueline Mendoza Solórzano.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

- a) El convenio de asignación de Recursos no reembolsables suscrito entre el Banco del Estado y el Gobierno Cantonal de Sucre para el financiamiento de la obra objeto de éste contrato.
- b) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- c) La oferta presentada por el CONTRATISTA.
- d) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario.
- e) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
- f) La resolución de adjudicación.
- g) La certificación conferida por el señor *Director Financiero* que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
- h) La certificación conferida por la señora *Secretaria General del Concejo* con la se acredita la calidad de los representantes de LA CONTRATANTE.
- i) La certificación del pago de los pliegos mediante el Título de Crédito N° 23901 de fecha 12 de Abril del 2010, por el valor de CIENTO CINCUENTA DOLARES AMERICANOS (USD \$ 150.00).

Cláusula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- 1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato,

El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

En caso de falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.



3.02.- Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a) "**Adjudicatario**", es el oferente a quien la máxima autoridad del Gobierno Cantonal de Sucre le adjudica el contrato;
- b) "**Comisión Técnica**", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- c) "**INCOP**", Instituto Nacional de Contratación Pública.
- d) "**LOSNCP**", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- e) "**Oferente**", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una oferta", en atención al llamado a licitación;
- f) "**Oferta**", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto "**Construcción de Aceras y Bordillos de hormigón Simple y Adoquinamiento en el sitio San Agustín Km. 20 de la parroquia Leonidas Plaza, Cantón Sucre**"

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la ejecución de la obra "**Construcción de Aceras y Bordillos de hormigón Simple y Adoquinamiento en el sitio San Agustín Km. 20 de la parroquia Leonidas Plaza, Cantón Sucre**".

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.


4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario No. 2 de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO ORIGINAL LO CERTIFICO

Caráquez:

Pedro Dávila Talledo 3 ABR 2010
Cantón Sucre
Manabí Ecuador



5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (USD 42.491.20) Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Uno 20/100 dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

ITEM	DESCRIPCION	U	CANT	V. UNIT.	V.TORAL
ACERAS Y BORDILLOS					
1	Replanteo y nivelación	M2	226.00	0.68	153.68
2	Excavación y desalojo	M3	19.04	5.23	99.58
3	Bordillos de hormigón simple	ML	476.00	12.72	6.054.72
4	Relleno compactado	M3	28.56	11.73	335.01
5	Aceras de hormigón simple	M2	285.60	11.21	3.201.58
ADOQUINAMIENTO VEHICULAR					
6	Reconformación de la subrasante	M2	1.849.88	0.74	1.368.91
7	Filtro de arena	M3	55.50	12.84	712.58
8	Adoquinamiento vehicular	M2	1.849.88	16.15	29.875.63
9	Berma de hormigón simple	ML	104.00	6.63	689.52

TOTAL

42.491.20

Son: (USD 42.491.20) Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Uno 20/100 dólares de los Estados Unidos de América

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- La CONTRATANTE entregará a el CONTRATISTA, en un plazo máximo de cinco días, contados desde la celebración del Contrato en calidad de anticipo; el valor del cuarenta por ciento (40 %) del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América, esto es la suma de Dieciséis Mil Novecientos Noventa y Seis 48/100 (USD 16.996.48)


El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.02.- El valor restante de la obra, esto es el sesenta por ciento (60%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas *mensuales*, debidamente aprobadas por la CONTRATANTE. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro monto a CONTRATISTA legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del reglamento general de la LOSNCP.



6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de diez días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de diez días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

6.05. Discrepancias.- Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los diez días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.08 de esta cláusula.

6.06.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

6.08.- En los cinco días primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.


Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada mes que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlas. Si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

6.09.- Planillas de liquidación.- Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final del rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

ciudad de Caráquez:

Abg. Rafael D. ... 13 ABR 2010

Oficio 2do. del Cantón Sucre



6.10.- Trámite de las planillas.- Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios" (formulario No.2), con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2) Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6) La fiscalización, en el plazo de diez días aprobará u objetará la planilla.


7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.

8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviere empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

Pagos indebidos.- La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE,



reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

a) **De fiel cumplimiento.**- El contratista para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el contrato, entrega a favor del Gobierno Cantonal de Sucre una garantía de las señaladas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del contrato.

b) **Del anticipo** En garantía del buen uso del anticipo, el contratista entrega a la orden del Gobierno Cantonal de Sucre una garantía de las señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al 100% del valor entregado por dicho concepto.

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

7.02.- **Ejecución de las garantías:** Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato.-

- Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
- Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

2) La del anticipo.-

- Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento; y,
- En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO


8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de sesenta días, contados a partir de la fecha de *notificación de que el anticipo se encuentra disponible*, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, con los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito, aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la FISCALÍA. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA continuará con el contrato.

ES EL COPIN DE ACEPTACIÓN
LO FISCALIA
13 ABR 2010
Ing. Pedro Dávila Talledo
Código 2do. del Cantón Sucre



ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato;

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios (formulario No.2), para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP;

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA; y,

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización.

Cláusula Décima.- MULTAS

10.01.- Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, el Gobierno Cantonal de Sucre aplicará una multa al Contratista por el 1 por 1.000 del valor del contrato.

Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS


11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula elaborada por el señor Director de Obras Públicas del Gobierno Cantonal de Sucre que se adjunta como documento habilitante a éste contrato:

$$Pr = Po \cdot 0.198(B1/B0) + 0,087 (C1/C0) + 0,543 (D1/D0) + - (E1/E0) + - (F1/F0) + 0,093 (G1/G0) + 0.054284(H1/H0) + - (I1/I0) + 0.020 (J1/J0) + -(K1/K0) + 0.005 (X1/X0)$$

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los Precios Unitarios Contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado;



Bo = Índice de precio de mano de obra, vigente 30 días antes para la presentación de la oferta,

B1 = Índice de precio de mano de obra, vigente a la fecha del pago del anticipo.

Co = Índice del precio de cemento portland vigente 30 días antes para la presentación de la oferta,

C1 = Índice de precio de cemento portland vigente a la fecha del pago del anticipo.

Do = Índice del precio de adoquines de hormigón vigente 30 días antes para la presentación de la oferta,

D1 = Índice del precio de adoquines de hormigón vigente a la fecha del pago del anticipo.

Go = Índice del valor del equipo, vigente 30 días antes para la presentación de la oferta,

G1 = Índice del valor del equipo vigente a la fecha del pago del anticipo o planilla.

Ho = Índice de precio de materiales pétreos, vigente 30 días antes para la presentación de la oferta,

H1 = Índice de precio de materiales pétreos, vigente a la fecha del pago del anticipo.

Jo = Índice de precio de madera aserrada, vigente 30 días antes para la presentación de la oferta,

J1 = Índice de precio de madera aserrada, vigente a la fecha del pago del anticipo.

Xo = Índice del valor de componentes no principales vigentes 30 días antes para la presentación de la oferta,

X1 = Índice del valor de componentes no principales vigentes a la fecha del pago del anticipo o planilla.


Todos los efectos de la formulas que tienen los índices Sub 0, corresponden a los índices de precios publicados por el INEC, vigente 30 días antes para la presentación de la oferta; y, los elementos de la formula contiene el sub índice 1, son los correspondientes a valores de la publicación vigente a la fecha del pago del anticipo o de las plantillas de ejecución de la obra.

CUADRILLA TIPO

CATEGORIA I		0.531
CATEGORIA III		0.304
CATEGORIA V		0.153
TOPOGRAFO 4		0.003
OEP-1		0.003
OEP-2	ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL	0.003
CHOFER E	LO CERTIFICO	0.003

Caracas, a los 13 días del mes de ABRIL del año 2010

Yo, Pedro Dávila Talledo,
Licenciado en Ingeniería Civil, del Cantón Sucre



Todos los elementos de la fórmula que contienen el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si no se encuentra en mora el contratista.

12.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios multiplicando el valor del anticipo (de haberlo), o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo si la hubiera, por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmula o fórmulas de reajustes, los precios o índices de precios, disponibles a la fecha de presentación de la planilla.

La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales.

12.03.- Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutada.

12.04.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente.

12.05.- Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

En los contratos complementarios a los que se refiere el artículo 85 de la Ley constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios

Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

12.01.- El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados servicios, previa autorización del Gobierno Cantonal de Sucre, de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del Reglamento General de la LOSNCP.


12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos con el personal de la subcontratista.

13.03.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa de contratación. En tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad



de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.9 de las condiciones específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-

15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general.

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su reglamento general.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de diez días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

16.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

16.06.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá treinta días para efectuar la liquidación del contrato.

Si no lo hiciere, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la CONTRATANTE. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.

ES UNA COPIA DE SU ORIGINAL

LO CERTIFICO

Fecha de Cotización:

13 ABR 2010

Msc. Pedro Dávila Talado

Notario Público 2do. del Cantón Sucre



16.07.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

16.08.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

17.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

19.01 La CONTRATANTE designa al señor Ing. José Abelardo Farías Andrade, Director de Obras Públicas del Gobierno Cantonal de Sucre, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Cláusula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO

20.01.- El Contrato termina:


- 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- 2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.
- 3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA.
- 4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP, y en el artículo 2 de la Resolución INCOP No. 037-09
- 5) Por muerte del CONTRATISTA.
- 6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21.01.- La solución de las controversias o divergencias surgidas en la ejecución del contrato, se someterán de conformidad a lo establecido en los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

De no tenerse el acuerdo del caso, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procesos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.



contratos de ejecución de obra y de consultoría, celebrados entre el Gobierno Cantonal de Sucre y cualquier persona natural o jurídica.

24.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA a la CONTRATANTE es de cinco copias. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Bahía de Caráquez, Cantón Sucre, Provincia de Manabí.

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

LA CONTRATANTE: Gobierno Cantonal de Sucre

Dirección: Av. Bolívar y Ascáubi esq.
Bahía de Caráquez, Cantón Sucre, Provincia de Manabí
Telf. 2693500 - 2692720

EL CONTRATISTA: Ingeniera Graciela Jacqueline Mendoza Solórzano

Dirección: calle García Moreno – Santa Marianita – Leonidas Plaza
Leonidas Plaza - Cantón Sucre
Telf. 090938445 - 098349758

Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

26.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado y firmado en la ciudad de Bahía de Caráquez, a los trece días del mes de Abril del año dos mil diez.


Dr. Carlos Mendoza Rodriguez
ALCALDE CANTON SUCRE


Abg. Eugenio Ureta Chica
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL


Ing. Graciela Jacqueline Mendoza Solórzano
CONTRATISTA



ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
LO CERTIFICO

Ciudad de Caráquez:

Abg. Pedro Dávila Talledo
Notario Público 2do. del Cantón Sucre

3 ABR 2010

21.02. Cláusula Arbitral: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, esta deberá ser en derecho, conforme lo dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado.

El arbitraje será en derecho y los árbitros serán profesionales del derecho.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

21.03. De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del contratante del Estado. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2439 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

21.04 La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

22.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES


23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS


24.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al artículo 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 65, de 30 de noviembre de 2001.

La CONTRATANTE le retendrá además al contratista al momento de realizar los pagos por concepto de anticipo y en cualquier planilla de avance de obra el valor correspondiente al dos por ciento (2%) de cada pago de conformidad con lo establecido en la ordenanza que reglamenta el cobro de la tasa de fiscalización en todos los



Nº 478.- DECLARACION JURAMENTADA Y VOLUNTARIA.- OTORGA LA INGENIERA GRACIELA JAQUELINE DEL ROCIO MENDOZA SOLORIZANO.- CUANTIA INDETERMINADA



-0-

En la Ciudad de Bahía de Caráquez, cabecera del Cantón Sucre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día Lunes Doce (12) de Abril del año dos mil diez (2010), ante mi Abogada, **OFELIA C. FALCONES MERO, NOTARIA PUBLICA PRIMERA SUPLENTE DEL CANTÓN SUCRE**, conforme a la **Acción de Personal Nº 958 de fecha 23 de Marzo del 2010**, comparece, **LA INGENIERA GRACIELA JAQUELINE DEL ROCIO MENDOZA SOLORIZANO**, portador de la cédula de ciudadanía Nº **130430021-1**, de estado Civil Soltera, mayor de edad, domiciliada en el Barrio Marianita de Jesús de la parroquia Leónidas Plaza del Cantón Sucre, hábil y capaz para contratar y obligarse a quien de conocerla doy fe.- Bien instruida de los efectos del presente acto declaratorio al que procede libre y voluntariamente, manifestando lo siguiente.-

- 1.- Que mis nombres, apellidos y demás generales son **GRACIELA JAQUELINE DEL ROCIO MENDOZA SOLORIZANO**, portadora de la cédula de ciudadanía Nº **130430021-1**, de estado Civil Soltera, domiciliada en el Barrio Marianita de Jesús de la parroquia Leónidas Plaza .-2.- Que mediante declaración juramentada manifiesta que no se encuentra impedida de contratar con ninguna Institución Pública, semipública, del Estado; o privadas, puesto que no mantiene deudas, ni juicios pendientes, por haber dilatado Recursos públicos o de cualquier entidad o Organismos del estado, etc.- 3.- Que no ha sido declarado contratista incumplido, ni adjudicatario fallido con el sector público:- 4.- Declara además que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 55 y 56 de la Ley de Contratación Pública y de no estar en quiebra ni litigio que puedan comprometer mi capacidad operacional y financiera.-5.- Que todo lo declarado lo hago en honor a la verdad y para los fines de ley.- Declaro que no me encuentro incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas por la ley para realizar esta declaración.- Hasta aquí su declaración, la misma que se afirma y se ratifica el comparecientes de su contenido integro y firma en unidad de acto conmigo.- El Notario que da fe.-



GRACIELA JAQUELINE DEL ROCIO MENDOZA SOLORIZANO
DECLARANTE
CED. CID. Nº 130430021-1



ES EL COPIA DE SU ORIGINAL
LO CERTIFICO
Bahía de Caráquez:

Ofelia C. Falcones Mero
13 ABR 2010

OFELIA C. FALCONES MERO
NOTARIA PUBLICA PRIMERA SUPLENTE DEL CANTON SUCRE

ENCARGADO

Primera Suplente
CANTON SUCRE

Original

13 ABR 2010

	REPÚBLICA DEL ECUADOR	ACCIÓN DE PERSONAL
	FUNCIÓN JUDICIAL	N°..... : 958
	DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL	Fecha : 23/03/2010

1. <input type="checkbox"/> Corte Nacional de Justicia <input checked="" type="checkbox"/> Corte Provincial de Justicia Manabí	3. Acuerdo <input type="checkbox"/> Resolución <input type="checkbox"/> Decreto <input type="checkbox"/>
---	--

2. <u>FALCONES MERO OFELIA CONCEPCION</u> Apellidos Nombres	4. Rige a partir de 23/03/2010
---	--------------------------------


5. N° <u>1303167025</u> Cédula de Ciudadanía	6. N° <u>S/N</u> Certificado o Libreta Militar	7. N° <u>153-009</u> Certificado Votación
---	---	--

8. TIPO <input type="checkbox"/> Nombramiento Provisional <input type="checkbox"/> Nombramiento Definitivo <input type="checkbox"/> Cambio Administrativo <input type="checkbox"/> Ascenso <input type="checkbox"/> Reclasificación <input type="checkbox"/> Revaloración <input type="checkbox"/> Licencia <input type="checkbox"/> Vacaciones <input type="checkbox"/> Subrogación <input checked="" type="checkbox"/> Encargo <input type="checkbox"/> Renuncia <input type="checkbox"/> Amonestación <input type="checkbox"/> Multa <input type="checkbox"/> Suspensión <input type="checkbox"/> Destitución <input type="checkbox"/> Supresión <input type="checkbox"/> Comisión <input type="checkbox"/> Otros	9. EXPLICACIÓN EL SEÑOR DOCTOR OSWALDO SEGOVIA MEDINA, DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN MANABÍ, PROCEDE A ENCARGAR EL DESPACHO DE LA NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON SUCRE-BAHÍA DE CARÁQUEZ, DESDE EL 23 DE MARZO HASTA EL 21 DE ABRIL DEL 2010, TODA VEZ QUE EL TITULAR HARÁ USO DE SUS VACACIONES.
---	---

10. SITUACIÓN ACTUAL Dependencia <u>CORTE PROV. JUSTICIA MANABÍ</u> Departamento <u>NOTARIA PRIMERA DE BAHIA</u> Puesto <u>NOTARIO SUPLENTE</u> Sueldo Unificado <u>0</u> Lugar de Trabajo <u>BAHÍA</u> Part. Presupuest. <u>100104</u>	11. SITUACIÓN PROPUESTA Dependencia <u>CORTE PROV. JUSTICIA MANABÍ</u> Departamento <u>NOTARIA PRIMERA DE BAHIA</u> Puesto <u>NOTARIO SUPLENTE</u> Sueldo Unificado <u>0</u> Lugar de Trabajo <u>BAHÍA</u> Part. Presupuest. <u>100104</u>
--	---


12. La persona reemplaza a...
 Quien cesó en el cargo con fecha...

13. *[Signature]*
 14. Director Nacional de Personal



DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

[Signature]
 Dr. Oswaldo Segovia Medina
 DIRECTOR PROVINCIAL (E) DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO MANABÍ
 ZAMBRANO



ENCARGADO
 PRIMERA
 SUCRE

12 ABR 2010

ECUATORIANA***** E333311112

SOLTERO
SUPERIOR
ING. CIVIL

EURIPIDES MENDOZA
RWA SOLÓRZANO

CIUDADANIA No. 130430021-1

MENDOZA SOLÓRZANO GRACIELA JANELINE DEL ROSARIO
MORONA/CHONE/SAN ANTONIO /DEL PELUDO/

28 DE DICIEMBRE 1943

REN Mnb 0183870

01/08/2003



01/08/2015

002-001570457-F

KANARY/CHONE

1945

NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO
Baha de Caraquez Ma. Equador
CANTON SUCRE

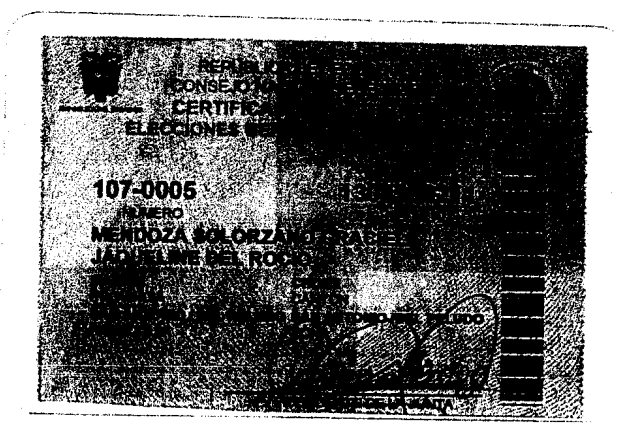

BIEN COPIA DE SU ORIGINAL
LO CERTIFICO
Caraquez: 3 ABR 2010
Dávida Talledo
Cantón Sucre

Graciela Solórzano


ENCARGADO

12 ABR 2010

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA QUE CONSTA TRES FOJAS UTILES QUE FIRMO, SIGNO Y SELLO.- EN BAHIA DE CARAQUEZ, EN LA FECHA DE SU CELEBRACION.

Ofelia Falcones Mero

AB. OFELIA C. FALCONES MERO
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA SUPLENTE DEL CANTON SUCRE



ESPACIO BLANCO

ESPACIO BLANCO

